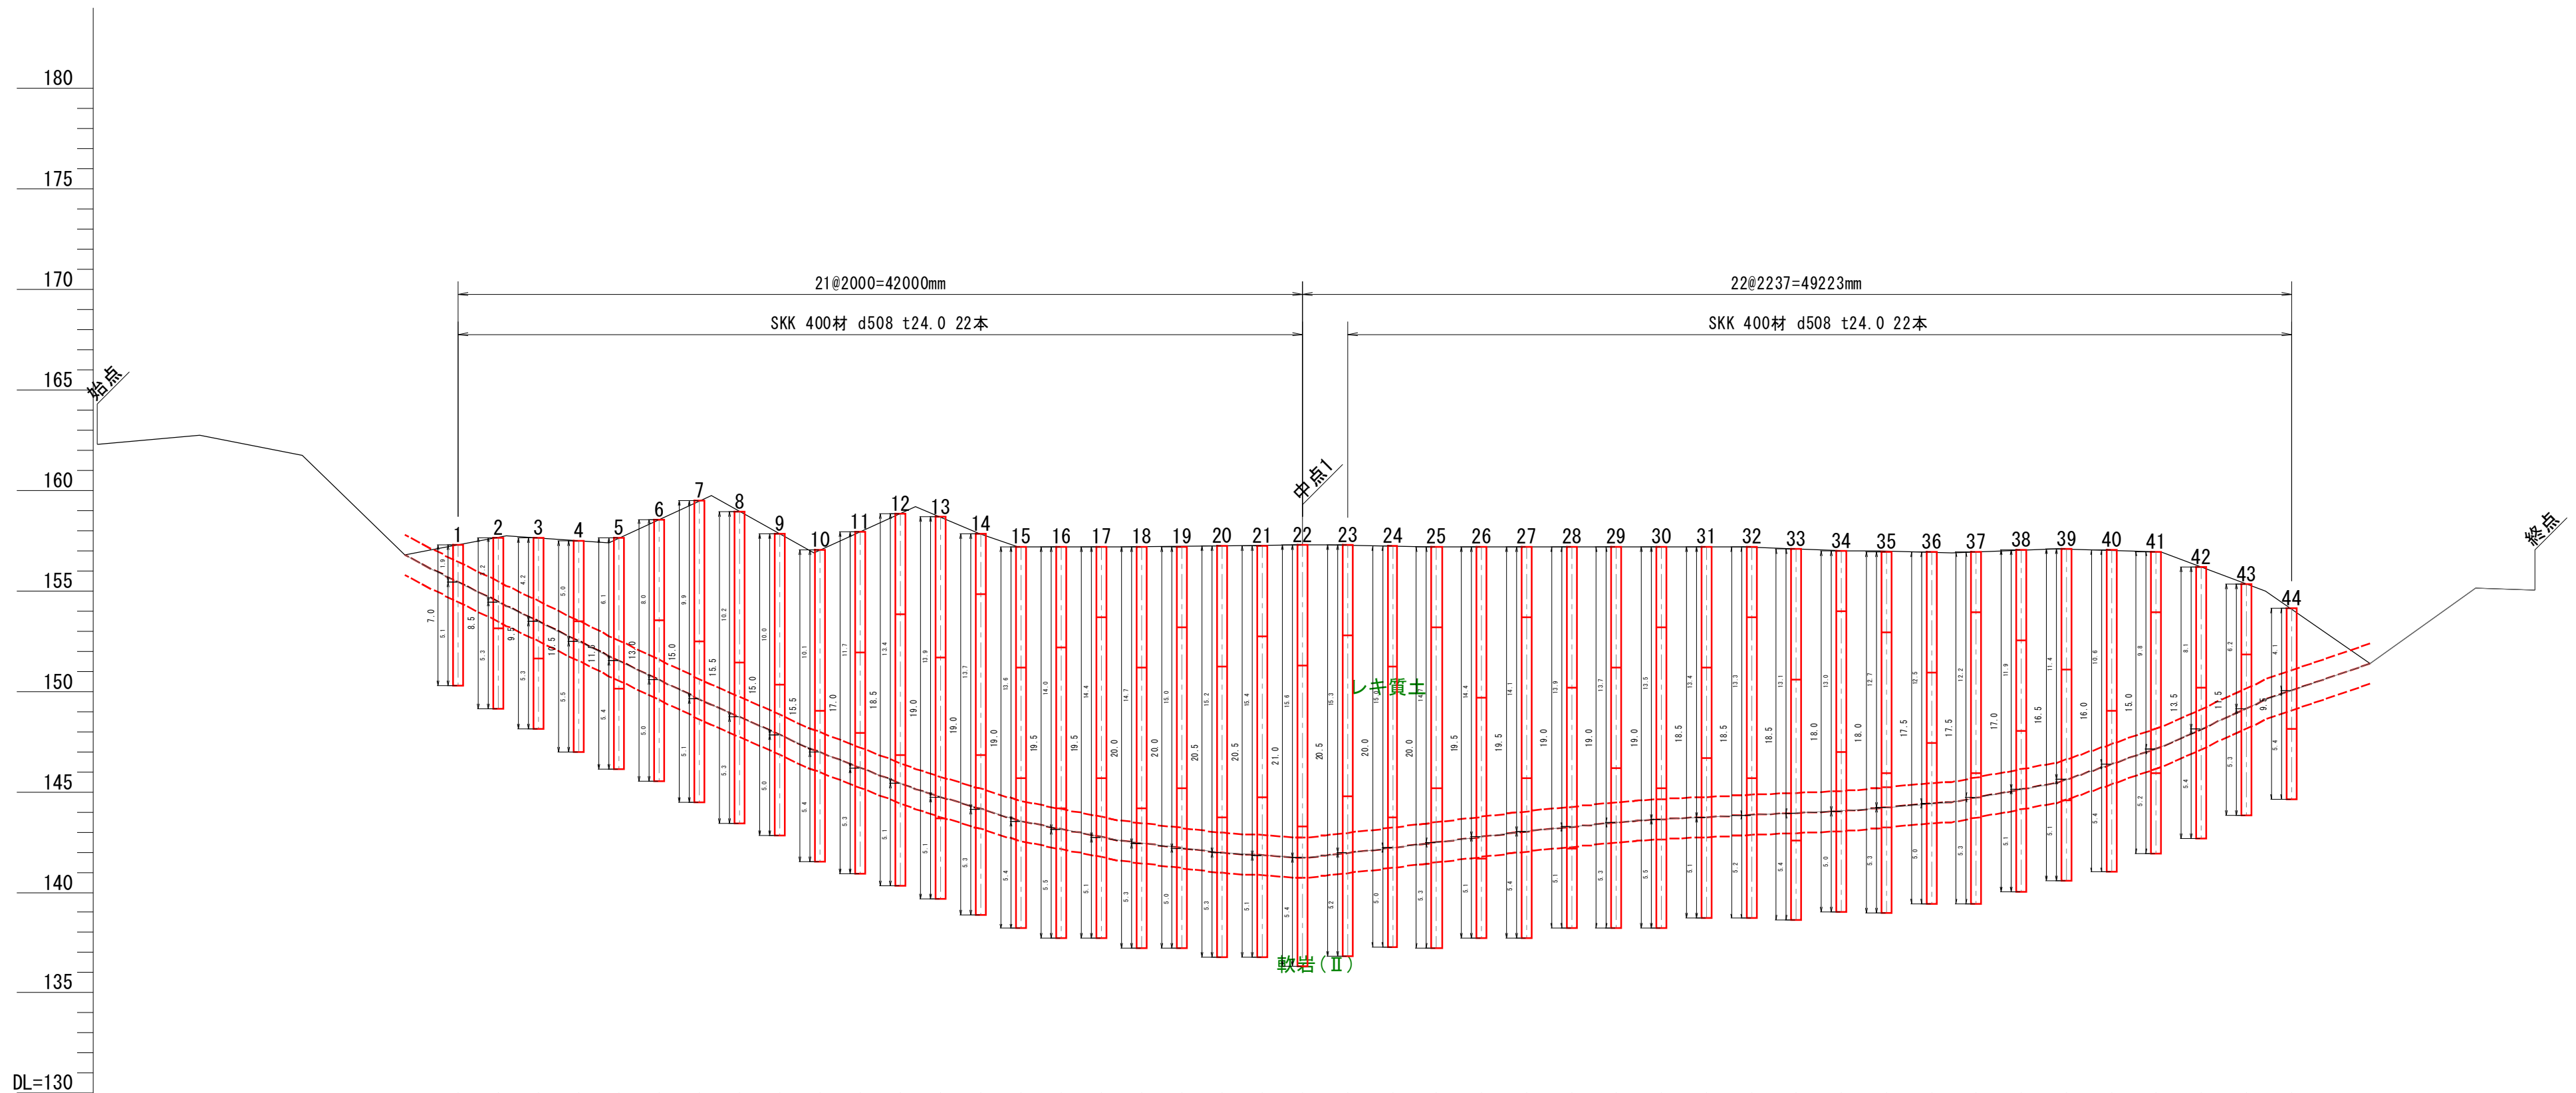

杭No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
地盤高	157.31	157.67	157.65	157.52	157.65	158.57	159.50	158.97	157.84	157.03	157.95
杭頭高	157.31	157.67	157.65	157.52	157.65	158.57	159.50	158.97	157.84	157.03	157.95
継手箇所	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
上杭長	7.0	4.5	6.0	4.0	7.5	5.0	7.0	7.5	7.5	8.0	6.0
中杭長											4.0
下杭長		4.0	3.5	6.5	4.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.5	7.0
杭全長	7.0	8.5	9.5	10.5	11.5	13.0	15.0	15.5	15.0	15.5	17.0
レキ質土	1.9	3.2	4.2	5.0	6.1	8.0	9.9	10.2	10.0	10.1	11.7
軟岩（Ⅱ）	5.1	5.3	5.3	5.5	5.4	5.0	5.1	5.3	5.0	5.4	5.3
削孔長全長	7.0	8.5	9.5	10.5	11.5	13.0	15.0	15.5	15.0	15.5	17.0
足場高											
平面 X 座標	114.754	114.387	114.021	113.654	113.288	112.921	112.554	112.188	111.821	111.455	111.088
平面 Y 座標	27.625	29.591	31.557	33.523	35.489	37.455	39.421	41.387	43.354	45.320	47.286

杭No.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
地盤高	158.86	158.68	157.83	157.18	157.18	157.18	157.19	157.21	157.23	157.27	157.30
杭頭高	158.86	158.68	157.83	157.18	157.18	157.18	157.19	157.21	157.23	157.27	157.30
継手箇所	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
上杭長	5.0	7.0	3.0	6.0	5.0	3.5	6.0	4.0	6.0	4.5	6.0
中杭長	7.0	8.0	8.0	5.5	8.0	8.0	7.0	8.0	7.5	8.0	8.0
下杭長	6.5	4.0	8.0	7.5	6.5	8.0	7.0	8.0	7.0	8.0	7.0
杭全長	18.5	19.0	19.0	19.0	19.5	19.5	20.0	20.0	20.5	20.5	21.0
レキ質土	13.4	13.9	13.7	13.6	14.0	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4	15.6
軟岩（Ⅱ）	5.1	5.1	5.3	5.4	5.5	5.1	5.3	5.0	5.3	5.1	5.4
削孔長全長	18.5	19.0	19.0	19.0	19.5	19.5	20.0	20.0	20.5	20.5	21.0
足場高											
平面 X 座標	110.722	110.355	109.988	109.622	109.255	108.889	108.522	108.156	107.789	107.423	107.056
平面 Y 座標	49.252	51.218	53.184	55.150	57.116	59.083	61.049	63.015	64.981	66.947	68.913

杭No.	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
地盤高	157.29	157.24	157.19	157.20	157.20	157.20	157.20	157.20	157.20	157.18	157.10
杭頭高	157.29	157.24	157.19	157.20	157.20	157.20	157.20	157.20	157.20	157.18	157.10
継手箇所	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
上杭長	4.5	6.0	4.0	7.5	3.5	7.0	6.0	4.0	6.0	3.5	6.5
中杭長	8.0	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	5.0	8.0	4.5	8.0	8.0
下杭長	8.0	6.5	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	7.0	8.0	7.0	4.0
杭全長	20.5	20.0	20.0	19.5	19.5	19.0	19.0	19.0	18.5	18.5	18.5
レキ質土	15.3	15.0	14.7	14.4	14.1	13.9	13.7	13.5	13.4	13.3	13.1
軟岩（Ⅱ）	5.2	5.0	5.3	5.1	5.4	5.1	5.3	5.5	5.1	5.2	5.4
削孔長全長	20.5	20.0	20.0	19.5	19.5	19.0	19.0	19.0	18.5	18.5	18.5
足場高											
平面 X 座標	107.676	108.295	108.914	109.534	110.153	110.773	111.392	112.012	112.631	113.251	113.870
平面 Y 座標	71.063	73.213	75.363	77.513	79.663	81.813	83.963	86.113	88.263	90.413	92.563

杭No.	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
地盤高	157.02	156.97	156.93	156.95	157.03	157.08	157.03	156.97	156.22	155.37	154.13
杭頭高	157.02	156.97	156.93	156.95	157.03	157.08	157.03	156.97	156.22	155.37	154.13
継手箇所	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
上杭長	3.0	4.0	6.0	3.0	4.5	6.0	8.0	3.0	6.0	3.5	6.0
中杭長	7.0	7.0	3.5	8.0	4.5	6.5		8.0			
下杭長	8.0	7.0	8.0	6.5	8.0	4.0	8.0	4.0	7.5	8.0	3.5
杭全長	18.0	18.0	17.5	17.5	17.0	16.5	16.0	15.0	13.5	11.5	9.5
レキ質土	13.0	12.7	12.5	12.2	11.9	11.4	10.6	9.8	8.1	6.2	4.1
軟岩（Ⅱ）	5.0	5.3	5.0	5.3	5.1	5.1	5.4	5.2	5.4	5.3	5.4
削孔長全長	18.0	18.0	17.5	17.5	17.0	16.5	16.0	15.0	13.5	11.5	9.5
足場高											
平面 X 座標	114.490	115.109	115.729	116.348	116.968	117.587	118.207	118.826	119.446	120.065	120.684
平面 Y 座標	94.713	96.863	99.013	101.163	103.312	105.462	107.612	109.762	111.912	114.062	116.212
